



171001060639



检测报告

TESTING REPORT

No: 报告编号: A01790102300382

产品名称
PRODUCT NAME

预制叠合板

工程名称
PROJECT NAME

/

委托单位
CLIENT

山东中岩重科新材料科技有限公司

生产单位
PRODUCING UNIT

山东中岩重科新材料科技有限公司

江苏省建筑工程质量检测中心有限公司
JIANGSU TESTING CENTER FOR QUALITY OF CONSTRUCTION ENGINEERING (Co.,Ltd.)



扫描全能王

注 意 事 项

一、本检验检测报告如未加盖本中心检验检测专用章或未加贴防伪标记，视为无效。

二、本检验检测报告未经本中心书面允许，不得以任何方式复制。经同意复制的检验检测报告应全文复制并经本中心加盖检验检测专用章确认后方有效。

三、若对本检验检测报告有异议者，请于收到报告之日起十五日内以书面形式向本中心提出。

本中心联系方式：

地 址：江苏省南京市栖霞区元化路8号

邮 编：210033

业务接待：(025)85201059, 85201058, 85200528, 83278543

办 公 室：(025)83278687

投诉电话：(025)85458162

传 真：(025)85458100

网 址：<http://jsgcjc.com>

电子邮箱：jsjczx@jsgcjc.com



扫描全能王

报告编号: A01790102300382

第 1 页 共 4 页

委托单位	山东中岩重科新材料科技有限公司		
建设单位	/		
施工单位	/		
工程名称	/		
监理单位	/		
见证人/见证号	/	工程监督号	/
委托编号	2362382	样品编号	239010000361
样品名称	预制叠合板	规格型号	3020×1400×60 (mm)
生产厂家/产地	山东中岩重科新材料科技有 限公司//	批 号	/
生产日期/出厂日期	/	样品数量/代表数量	5//
抽样数量/抽样基数	/	抽样日期/抽样地点	/
到样日期	/	样品状态	可检
检测类别	型式检验	检测地点	生产厂家等
委托日期	2023-10-12	检测日期	2023-10-12~2023-10-14
检测 判定 依据	《装配式混凝土结构预制构件质量检验规程》DB32/T 4075-2021 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015 委托方提供的设计信息		
检测 结论	经检测, 该样品所检项目均符合《装配式混凝土结构预制构件质量检验 规程》DB32/T 4075-2021 中的技术要求和委托方提供的设计要求。		
检 测	邵功坤		
校 核	杨福华		
批 准	方平		

江苏省建筑工程质量检测中心有限公司
(3)
签发日期:2023 年 10 月 17 日



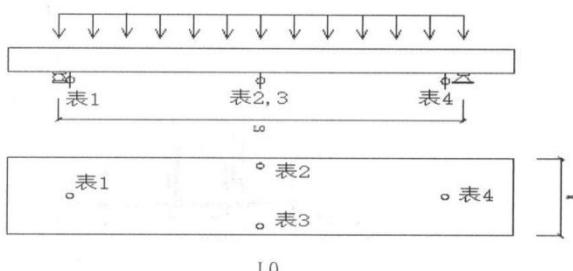
本报告未贴中心防伪标记视为无效



扫描全能王

检验项目			单位	技术要求	检测结果	单项 评定
1	外观 质量	露筋	/	不应有严重缺陷	5 个构件均无缺陷	合 格
		蜂窝		不应有严重缺陷	5 个构件均无缺陷	合 格
		孔洞		不应有严重缺陷	5 个构件均无缺陷	合 格
		夹渣		不应有严重缺陷	5 个构件均无缺陷	合 格
		疏松		不应有严重缺陷	5 个构件均无缺陷	合 格
		裂缝		不应有严重缺陷	5 个构件均无缺陷	合 格
		连接部位缺陷		不应有严重缺陷	5 个构件均无缺陷	合 格
		外形缺陷		不应有严重缺陷	5 个构件均无缺陷	合 格
		外表缺陷		不应有严重缺陷	5 个构件均无缺陷	合 格
2	尺寸 偏差	长度	mm	± 5	-2~+3 (5个构件合格)	合 格
		宽度		± 5	-1~+2 (5个构件合格)	合 格
		厚度		± 5	-1~+2 (5个构件合格)	合 格
		对角线差		5	1~2 (5个构件合格)	合 格
		侧向弯曲		$L/750 (4.03)$ 且 ≤ 20	1~2 (5个构件合格)	合 格
		翘曲		$L/750 (4.03)$	0~2 (5个构件合格)	合 格
		底板平整度		3	0~1.5 (5个构件合格)	合 格
		钢筋外伸长度		± 5	0~+2 (5个构件合格)	合 格
3	混凝土抗压强度		MPa	C30	43.8, 44.1, 43.1, 43.6, 43.6	合 格

检验项目			单位	技术要求	检测结果	单项 评定
4	钢筋保护层厚度			15（+8,-5）	16, 18, 19, 17, 14, 15	合 格
					14, 16, 17, 18, 16, 17	
					13, 15, 18, 17, 15, 17	
					15, 17, 18, 16, 14, 14	
					17, 19, 14, 15, 16, 15	
	钢筋间距		mm	200（±10）	202, 203, 197, 199, 201	合 格
					199, 202, 198, 203, 202	
					201, 198, 197, 202, 200	
					202, 201, 199, 198, 197	
					199, 197, 196, 202, 203	
	钢筋直径（内径）			7.7（±0.4）	7.9	合 格
					7.8	
					7.8	
					7.8	
					7.9	
	主受力钢筋数量		根	8	8	合 格
					8	
					8	
					8	
					8	
5	粗糙度		mm	≥4.0	4.1, 4.2, 4.3	合 格
6	结构性能	挠度	mm	≤4.00	1.89	合 格
		裂缝 宽度	mm	不应产生 裂缝	荷载检验值加载量下板底未出现裂缝	合 格

备注	1、检测地点: 山东中岩重科新材料科技有限公司生产厂区、红山路107号; 2、外观尺寸合格率: 100%, 钢筋保护层厚度合格率: 100%; 3、第4项检测结果依次对应为样品01、样品02、样品03、样品04、样品05; 4、第5项检测结果依次对应为样品01、样品02、样品03; 5、第6项检测结果为样品01。
说明	第1~2项检测方法: DB32/T 4075-2021; 第3项检测方法: GB/T 50081-2019; 第4项检测方法: JGJ/T 152-2019, GB/T 1499.2-2018; 第5项检测方法: DB32/T 3754-2020; 第6项检测方法 DB32/T 4075-2021; 结构性能加载简图: 

检测用主要仪器设备一览表

序号	名称	规格型号	编号	量程	检定有效期
1	钢卷尺	5m	LS0888	0-5m	2024-02-06
2	数显游标卡尺	0-150mm	LS0554	0-150mm	2024-05-18
3	裂缝测宽仪	HC-CK102	LS101765	/	2024-07-30
4	钢直尺	0-300mm	LS0967	0-300mm	2024-02-19
5	一体式钢筋扫描仪	HC-GY61T	LG0424	/	2024-03-28
6	电子台秤	TCS-200	FM10823	200kg	2024-06-13
7	数显百分表	0-30mm	LS14497	0-30mm	2024-08-23
8	数显百分表	0-30mm	LS14498	0-30mm	2024-08-23
9	数显百分表	0-30mm	LS14499	0-30mm	2024-08-23
10	数显百分表	0-30mm	LS14500	0-30mm	2024-08-23
11	电子秒表	/	HT10104	/	2024-06-19
