



231001341493



检测报告

TESTING REPORT

报告编号: A01721512500217
No: _____

产品名称
PRODUCT NAME

居住建筑浮筑楼板保温隔声系统
(I型石墨+表面覆膜)

工程名称
PROJECT NAME

/

委托单位
CLIENT

江苏雅思贝节能科技有限公司

生产单位
PRODUCING UNIT

江苏雅思贝节能科技有限公司

江苏省建筑工程质量检测中心有限公司

JIANGSU TESTING CENTER FOR QUALITY OF CONSTRUCTION ENGINEERING (Co.,Ltd.)




委托单位	江苏雅思贝节能科技有限公司		
建设单位	/		
施工单位	/		
工程名称	/		
监理单位	/		
见证人/见证号	/	工程监督号	/
委托编号	2503624	样品编号	252151000052
样品名称	居住建筑浮筑楼板保温隔声系统(I型石墨+表面覆膜)	规格型号	/
生产厂家/产地	江苏雅思贝节能科技有限公司//	批 号	/
生产日期/出厂日期	/	样品数量/代表数量	/
抽样数量/抽样基数	/	抽样日期/抽样地点	/
到样日期	/	样品状态	可检
检测类别	现场检测	检测地点	工程现场
委托日期	2025-04-09	检测日期	2025-04-09~2025-04-12
检测判定依据	《民用建筑节能工程热工性能现场检测标准》DB32/T 4107-2021 《居住建筑浮筑楼板保温隔声工程技术规程》DB32/T 3921-2020		
检测结论	经检测,江苏省连云港市灌云县依云湖畔项目11号楼302室主卧与202室主卧之间的居住建筑浮筑楼板保温隔声系统的传热系数为 $1.07\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ 。		
检 测	王羽 25439		
校 核	陈苑 08916		
批 准	张黎 00088		
江苏省建筑工程质量检测中心有限公司 签发日期:2025年 04 月 22 日			



检 测 结 果 汇 总				
序号	位置	检测参数	单位	检测结果
1	江苏省连云港市灌云县伊云湖畔项目 11 号楼 202 室主卧与 302 室主卧之间楼地面	传热系数	W/(m ² ·K)	1.07
备注	1、江苏省建筑工程质量检测中心有限公司受江苏雅思贝节能科技有限公司委托，于 2025 年 04 月 09 日赴工程现场,对居住建筑浮筑楼板保温隔声系统（I 型石墨+表面覆膜）的传热系数进行检测； 2、委托方提供的楼板构造（从上到下）：40mm 细石混凝土（含钢筋网片）+20mm 厚（II 型石墨 EPS+表面覆膜）保温隔声板+120mm 现浇混凝土楼板，该保温隔声系统与墙面接触的部位设有竖向隔声片； 3、被测居住建筑浮筑楼板保温隔声系统（I 型石墨+表面覆膜）测点位置示意图见附图； 4、江苏省连云港市灌云县伊云湖畔项目共计 386 户，本中心于 2025 年 03 月 12 日现场抽取 1 户，位置为 11 号楼 202 室主卧与 302 室主卧之间楼地面；抽样人：张异、居香舟。			
检 测 用 主 要 仪 器 设 备				
序号	名 称	规格型号	编 号	检定有效期
1	建筑围护热工性能检测设备	R90D	TF0830	2025-11-09
本页以下空白				

附图: 测点位置示意图

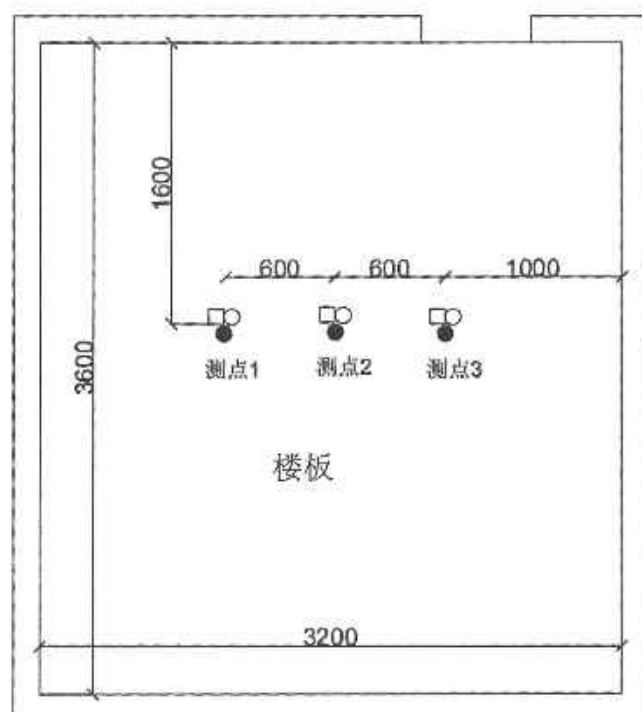

11 号楼 302 室主卧与 202 室主卧之间楼地面的
居住建筑浮筑楼板保温隔声系统测点位置示意图

图例说明: 单位 (mm)

- 热流计布点
- 上侧铂电阻温度传感器布点
- 下侧铂电阻温度传感器布点
